LANTMÄTERIET

A3L

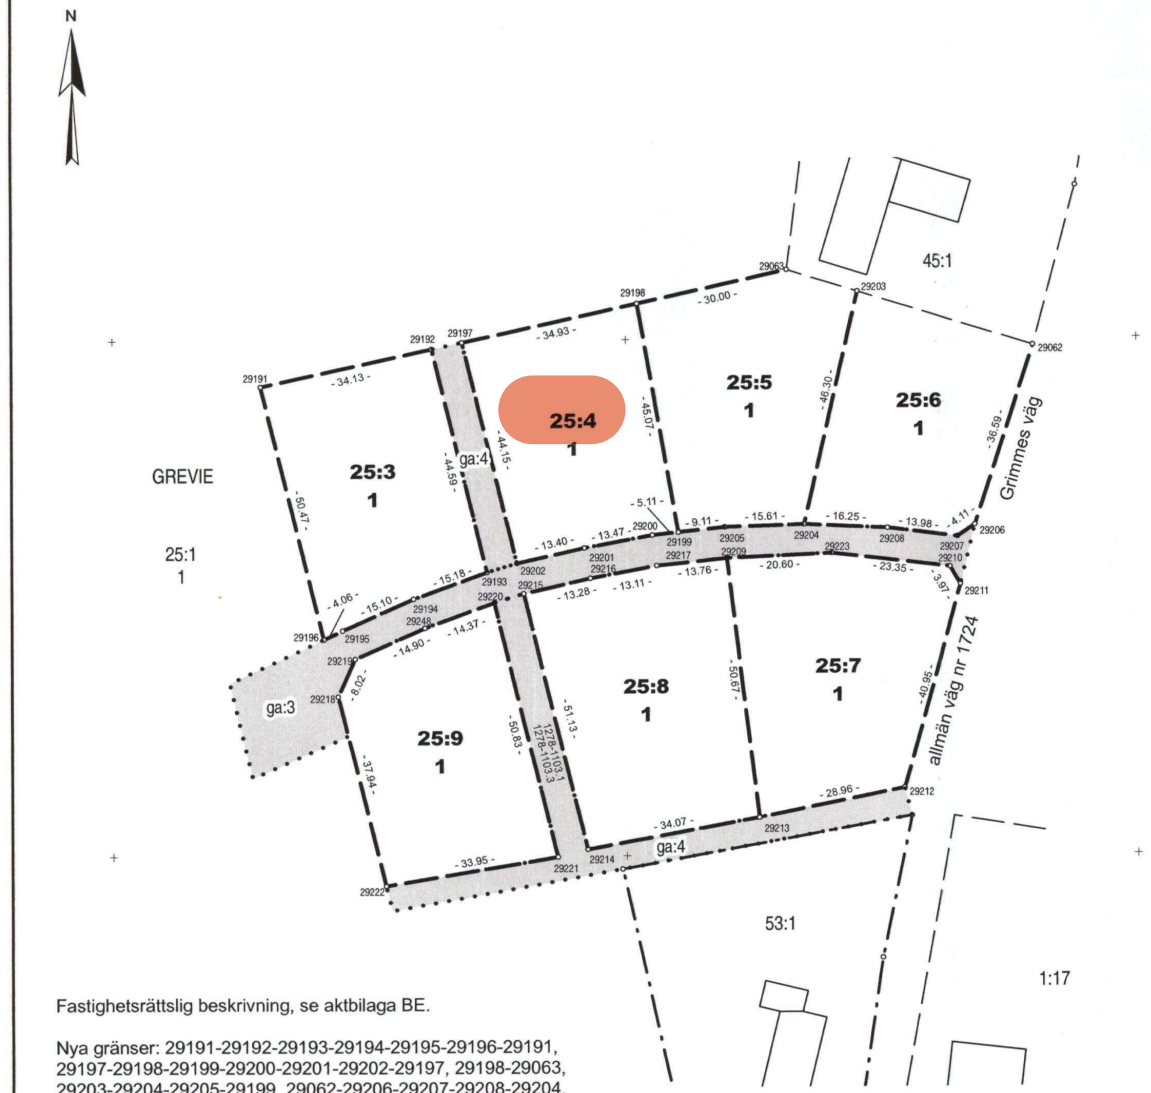

1:17

Fastighetsrättslig beskrivning, se aktbilaga BE.

Nya gränser: 29191-29192-29193-29194-29195-29196-29191, 29197-29198-29199-29200-29201-29202-29197, 29198-29063, 29203-29204-29205-29199, 29062-29206-29207-29208-29204, 29209-29223-29210-29211-29212-29213-29209, 29213-29214-29215-29216-29217-29209, 29218-29219-29248-29220-29221-29222-29218.

Nybildade fastigheter:

blivande GREVIE 25:3
blivande GREVIE 25:4
blivande GREVIE 25:5
blivande GREVIE 25:6
blivande GREVIE 25:7
blivande GREVIE 25:8
blivande GREVIE 25:9

Teckenförklaring

- GA, blivande
- Gränspunkt
- Traktgräns, gällande
- Fastighetsgräns, gällande
- Fastighetsgräns, blivande
- GREVIE Traktnamn
- 1:2 3, 1:2 Fastighetsbeteckning, gällande
- 1:2 3 Fastighetsbeteckning, blivande
- Byggnad
- Ny gemensamhetsanläggning
- -11.23- Måttsättning

Teknisk beskrivning

Koordinatlista

Pkt	Norr	Öst	Markering
29062	6 250 798,58	105 979,83	gammalt rör i mark
29063	6 250 813,36	105 931,54	gammalt rör i mark
29191	6 250 791,08	105 828,87	Rör i mark, ny
29192	6 250 798,32	105 862,22	Rör i mark, ny
29193	6 250 755,03	105 872,91	Rör i mark, ny
29194	6 250 749,90	105 858,62	Rör i mark, ny
29195	6 250 743,86	105 844,78	Rör i mark, ny
29196	6 250 742,11	105 841,11	Rör i mark, ny
29197	6 250 799,59	105 868,09	Rör i mark, ny
29198	6 250 807,00	105 902,22	Rör i mark, ny
29199	6 250 762,63	105 910,20	Rör i mark, ny
29200	6 250 762,11	105 905,12	Rör i mark, ny
29201	6 250 759,69	105 891,87	Rör i mark, ny
29202	6 250 756,76	105 878,79	Rör i mark, ny
29203	6 250 809,13	105 945,38	Rör i mark, ny
29204	6 250 764,03	105 934,86	Rör i mark, ny
29205	6 250 763,57	105 919,26	Rör i mark, ny
29206	6 250 763,82	105 968,40	Rör i mark, ny
29207	6 250 761,55	105 964,97	Rör i mark, ny
29208	6 250 763,25	105 951,10	Rör i mark, ny
29209	6 250 757,58	105 919,66	Rör i mark, ny
29210	6 250 755,72	105 963,43	Rör i mark, ny
29211	6 250 752,33	105 965,50	Rör i mark, ny
29212	6 250 712,94	105 954,30	Rör i mark, ny
29213	6 250 707,30	105 925,89	Rör i mark, ny
29214	6 250 701,26	105 892,36	Rör i mark, ny
29215	6 250 750,90	105 880,11	Rör i mark, ny
29216	6 250 753,81	105 893,07	Rör i mark, ny
29217	6 250 756,17	105 905,97	Rör i mark, ny
29218	6 250 731,07	105 843,85	Rör i mark, ny
29219	6 250 738,37	105 847,18	Rör i mark, ny
29220	6 250 749,17	105 874,35	Rör i mark, ny
29221	6 250 699,82	105 886,53	Rör i mark, ny
29222	6 250 694,26	105 853,04	Rör i mark, ny
29223	6 250 758,46	105 940,23	Rör i mark, ny
29248	6 250 744,32	105 860,83	Rör i mark, ny

Koordinatkvalitet: Inre 0,025 yttre 0,025
Koordinatsystem: SWEREF99_13_30
Framställd genom:

Förrättningskarta

Aktbilaga KA

2010-12-17

Ärendenummer: M102039

Avstyckning från Grevie 25:1.

Kommun: Båstad
Län: Skåne

Mikael Almén
Förrättningslantmätare

Akt 1278-1964

105800 105900 106000
